

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2021

Techo Financiero: \$ 2,960,325.00 FAM Media superior 2021.- Notificado mediante copia de oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior a Gobierno del Estado de Hidalgo, número SEMS/135/2021 de fecha 19 de marzo de 2021

Otras Aportaciones: \$ 489,185.45 FAM Media Superior Ampliación de recursos estatales notificado mediante oficio número SEFINP-A-FAMMD/GI-2021-5005-00521 diciembre 2021

\$ 44,091.23 FAM Media Superior.- Rendimientos Financieros

\$ 7,714,825.77 Recurso Genérico estatal autorizado mediante oficio número CAF/1096/2021 de fecha 25 de mayo de 2021, emitido por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH

TOTAL \$ 11,208,427.45


Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Fisico	Financiero	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	
13UBH00161	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Zimapan	Zimapan	Zimapan	Construcción de aulas en la Escuela Superior de Zimapan, (2da. Etapa)	1	5	0	0	1	6	\$ 3,493,601.68	0	0	\$ 11,208,427.45	\$ 3,493,601.68	0	0	\$ 11,208,427.45	\$ 2,960,325.00	0	0	\$ 10,285,063.51	DGJIFAM MD 2021 - GEN ESTALPNO - N/02-2021	Constructora LUAN, S.A. de C.V.	05/07/2021	----	31/12/2021	----	100%	92%	- Se adjuntan fotografías de avance físico en la parte inferior de este reporte.
TOTAL (15)						1	5	0	0	1	6	\$ 11,208,427.45	0	0	\$ 11,208,427.45	\$ 11,208,427.45	0	0	\$ 11,208,427.45	\$ 10,285,063.51	0	0	\$ 10,285,063.51							100%	92%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						(16) REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Fisico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	1	5	0	0	1	6	\$ 11,208,427.45	\$ 11,208,427.45	\$ 10,285,063.51	0	1	0	100%	92%
(17) TOTAL							\$ 11,208,427.45	\$ 11,208,427.45	\$ 10,285,063.51	0	1	0	100%	92%

FOTOGRAFIAS AVANCE FISICO

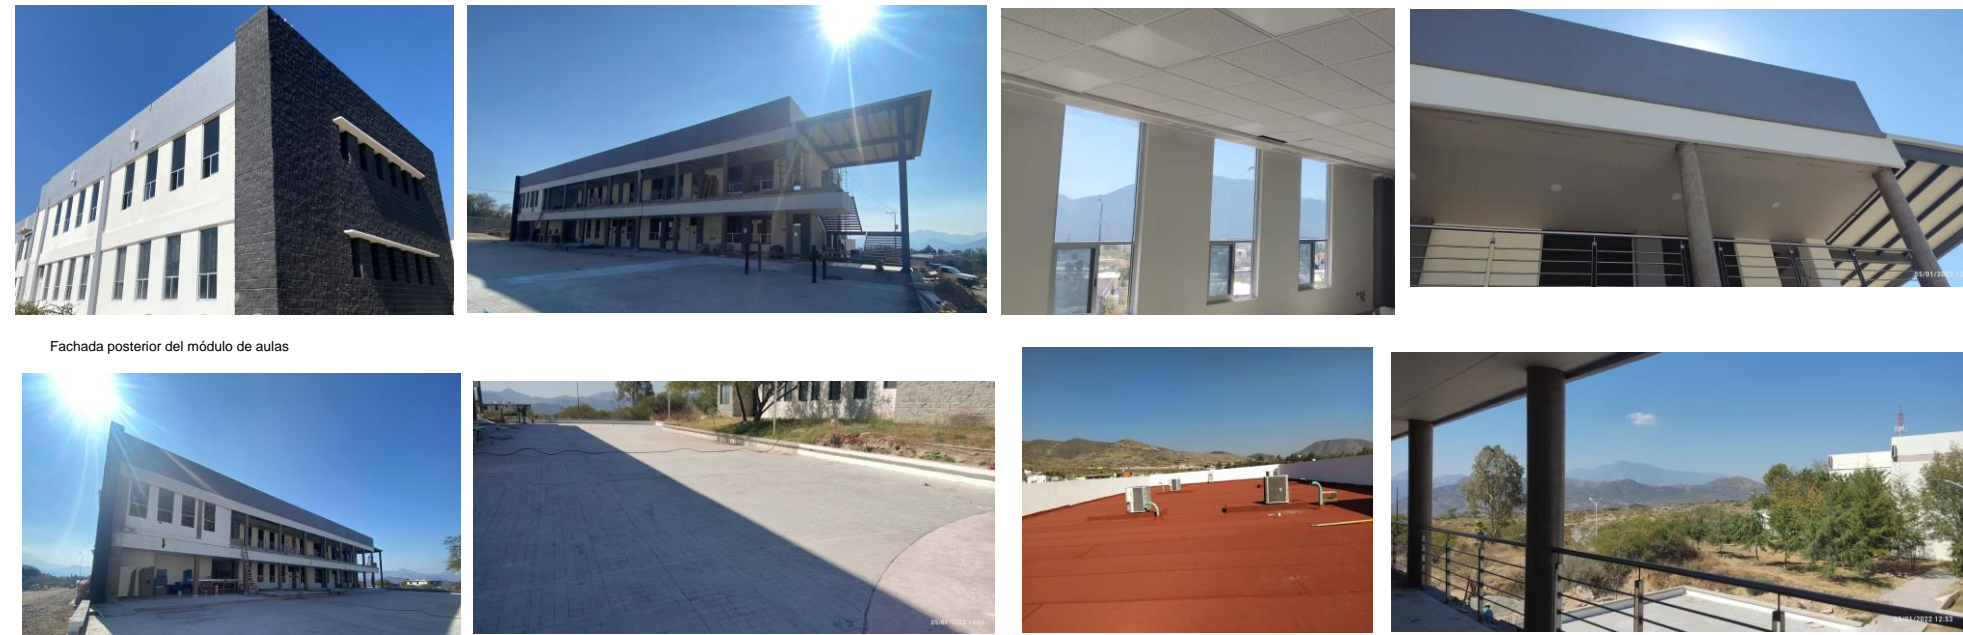

Fachada posterior del módulo de aulas
