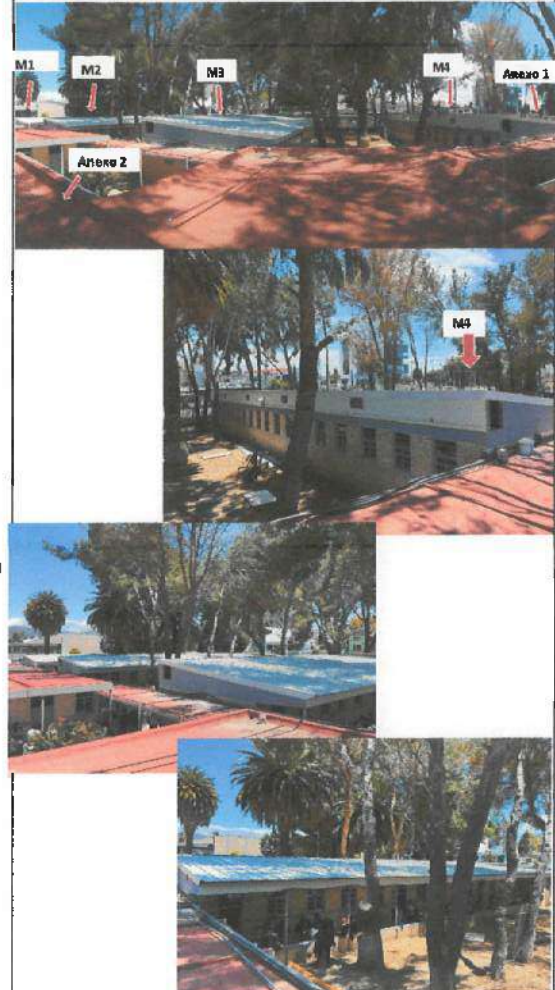
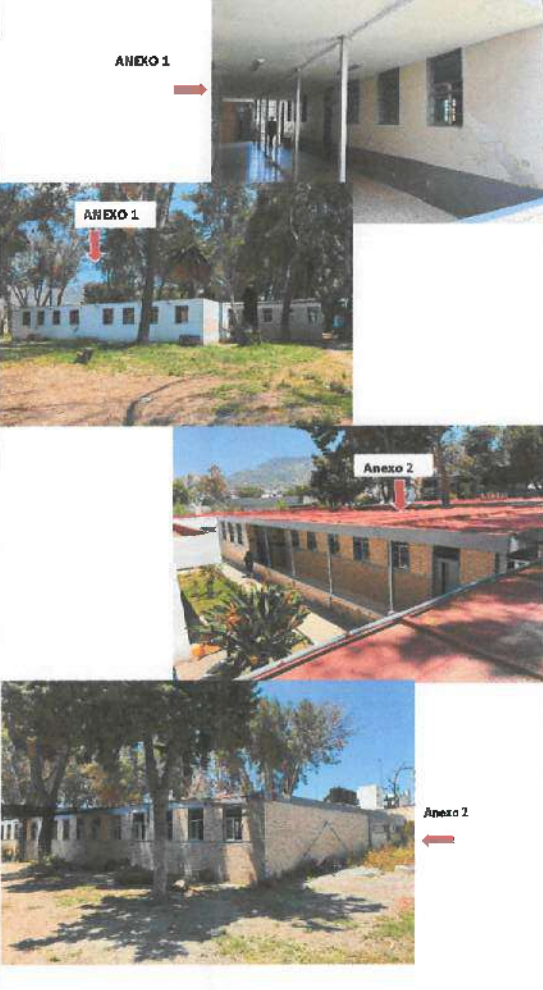


ENTIDAD FEDERATIVA	FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	SUBSISTEMA	SOSTENIMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ESTATUS DEL MOBILIARIO Y/O EQUIPO	EJECUTOR DEL GASTO	ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN	REINTEGRO	NÚMERO DE LÍNEA DE CAPTURA	OBSERVACIONES
Hidalgo	FAM Potenciado	2025	13UBH0007A	Escuela Preparatoria núm. 1	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Nombre de la Obra: "Sustitución de lámina de asbesto de módulos de aulas en la Escuela Preparatoria Núm. 1". Alcances: Módulo 1: botegues; sustitución de puertas; Módulo 2: cubierta parcial de lámina KR-18, bota aguas; sustitución de puertas. Módulo 3: Cubierta de lámina KR-18, bota aguas; sustitución de puertas. Módulo 4: Cubierta de lámina KR-18, bota aguas; sustitución de puertas. Anexo 1: Sustitución parcial de ventanas y puerta; Anexo 2: Sustitución parcial de ventanas y puerta; módulo aulas / sanitarios.- sustitución de ventanas y puertas.	Rehabilitación	Aula	\$ 1,193,463.49	\$ 1,193,463.49	\$ 286,398.23	UAEH/FAM MD 2025/INV-05/CO29-25	15/12/2025	14/03/2026	100%	24%	No aplica	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	6,175	Rehabilitación de "Sobre - techumbre" derivado del desgaste propio y vida útil del material, promoviendo aligeramiento del peso en estructura de módulos existentes, fortalecimiento y salvaguarda de la seguridad de la comunidad de la Escuela Preparatoria núm. 1, mejora de la eficiencia y confort térmico del edificio y reducción de costos de mantenimiento.	31/mar/26	No	No	No aplica	No aplica	1.- Obra contratada CON inversión total de \$3'160,927.89, conformada por recursos del FAM MD 2025 \$2'144,786.47, con cargo a FAM MD 2025 rendimientos \$45,446.24; Edu MD 2025 Potenciado Remanentes \$354,660.73 , y FAM MD 2025 Potenciado Remanentes Rendimientos \$18,031.43. Se integra a este informe trimestral un reporte por cada modalidad del fondo, el texto subrayado en esta observación señala a que modalidad del fondo corresponde este informe. 2.- La referencia asentada en la columna "FONDO" corresponde a las opciones que permite el formato proporcionado, el recurso asignado por gobierno del estado se recibe bajo la denominación de "FAM MD Potenciado Remanentes". 3.- Esta obra cuenta con 1er. convenio de ampliación al monto por \$252,453.80 conformada por FAM MD 2025 rendimientos \$7,923.12, FAM MD 2025 Potenciado Remanentes \$238,802.74; y con cargo a FAM MD 2025 Potenciado Remanentes Rendimientos \$5,688.70. 4.- El porcentaje financiero considera el anticipo otorgado, el porcentaje físico corresponde a la totalidad del contrato. 6.-Se rectifican metas conforme a pagos de trabajos ejecutados.
												\$ 1,193,463.49	\$ 1,193,463.49	\$ 286,398.23															\$ -

Notas:
 Ver en columna "observaciones" precisiones con respecto al Fondo.
 Este informe corresponde al contrato 2, inversión autorizada "C": Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior (FAM MD 2025) Potenciado Remanentes

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA	L.C. GABRIELA MORA VALENCIA	DR. OCTAVIO CASTILLO ACOSTA

FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Potenciado	Hidalgo	13UBH0007A	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Escuela Preparatoria núm. 1	<p>Nombre de la Obra: "Sustitución de lámina de asbesto de módulos de aulas en la Escuela Preparatoria Núm. 1". Alcances: Módulo 1: botaguas; sustitución de puertas; Módulo 2: cubierta parcial de lámina KR-18, bota aguas; sustitución de puertas. Módulo 3.- Cubierta de lámina KR-18, bota aguas; sustitución de puertas. Módulo 4.- Cubierta de lámina KR-18, bota aguas; sustitución de puerta; Anexo 1.- Sustitución parcial de ventanas y puerta; Anexo 2.- Sustitución parcial de ventanas y puerta; módulo aulas/sanitarios.- sustitución de ventanas y puertas.</p>		<p>Área atendida: Módulos tipo 1, 2, 3 y 4: terminación de la colocación cubiertas de lámina, botaguas; sustitución de puertas; Anexo 1.- Sustitución parcial de ventanas y puerta.</p>		<p>Área atendida: Anexo 1, 2 y módulo aulas/sanitarios.- Sustitución parcial de ventanas y puertas.</p>	No Aplica	No Aplica

ELABORÓ

ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEIRA

REVISÓ

L.C. GABRIELA MENDOZA VALENCIA

AUTORIZÓ

DR. OCTAVIO CASTILLO ACOSTA
